



Matthias Fluri  
Dufourstrasse 40/50  
CH-4001 Basel  
Telefon +41 (0)61 267 60 81  
E-Mail [matthias.fluri@bs.ch](mailto:matthias.fluri@bs.ch)

An die Anwohnerinnen und Anwohner,  
Geschäfte und Gewerbebetriebe im  
Projektperimeter und in unmittelbarer  
Umgebung der Freien Strasse

Basel, im November 2021


### **Erneuerung Freie Strasse und angrenzende Gassen Bauende erst im Herbst 2024 und Ausblick auf 2022**

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten in der Freien Strasse laufen auf Hochtouren. Bis zum Weihnachtsverkauf 2021 werden Tiefbauamt und IWB die unterirdischen Leitungen in der Freien Strasse oberhalb der Streitgasse vollständig saniert haben.

#### **Überarbeitetes Terminprogramm und Bauablauf: Ende erst 2024**

Ursprünglich war vorgesehen, dass die neue Freie Strasse bis Ende 2023 auf der ganzen Länge fertiggestellt ist. Die Erfahrungen nach rund einem Jahr Bauzeit haben aber gezeigt, dass wir unser Terminprogramm anpassen müssen. Wann die jeweiligen Bauabschnitte circa fertig werden sollen zeigt die folgende Illustration:

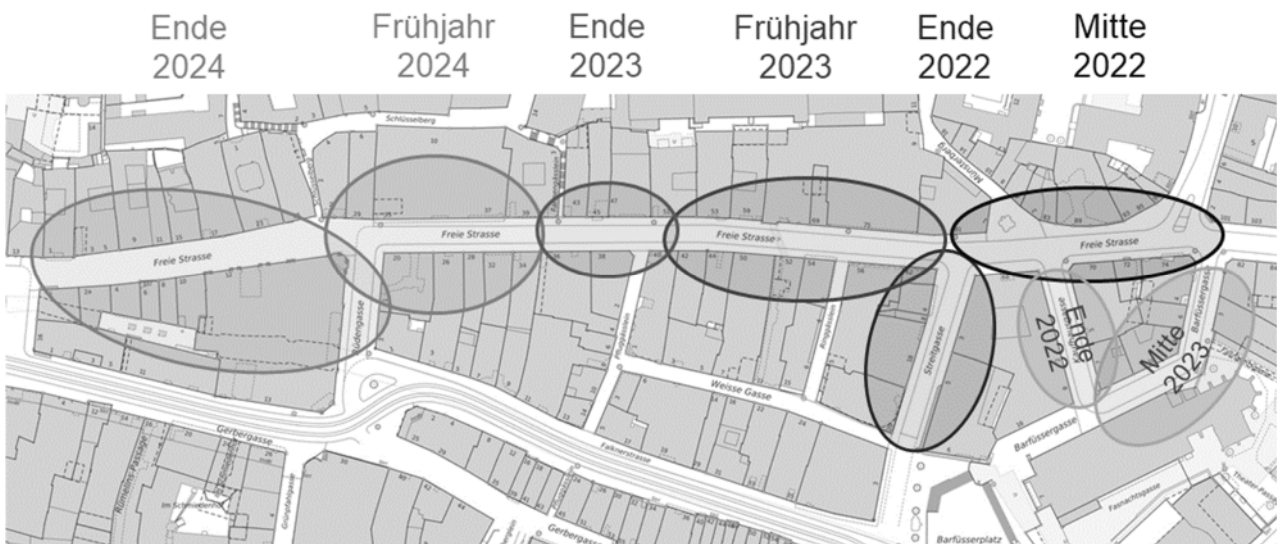

Uns ist bewusst, dass diese Verschiebungen für Sie eine zusätzliche Belastung bedeuten. Um die Verzögerung insgesamt so gering wie möglich zu halten, überlappen sich die Bauetappen nun deutlich stärker als ursprünglich vorgesehen. So können die Gräben für die Fernwärme möglichst frühzeitig ausgehoben werden.

Um die Bauarbeiten nicht zu verlängern und Sie nicht zusätzlich zu belasten, haben wir zunächst versucht die Bauabläufe zu optimieren. Der Aushub der neuen Leitungen und Schächte im unteren Teil der Freien Strasse ist jedoch sehr zeitaufwendig. Wo wir Fernwärmeleitungen bauen, liegen archäologische Fundstellen, die erhalten, erforscht und für künftige Generationen gesichert werden müssen.

### **Ausblick auf 2022**

Bis Mitte 2022 wird die Freie Strasse vom Bankverein bis zur Streitgasse mit Alpnacher Quarzsandstein gepflästert sein. Der Baum bei der Bäumeleingasse inkl. Sitzbank sowie der Dreizackbrunnen beim Münsterberg rücken in die Freie Strasse und erhalten so prominentere Standorte.

Von der Streitgasse bis zum Schlüsselberg werden in offenen Gräben in den Trottoirs die Wasser- und Stromleitungen ersetzt. Von der Rüdengasse bis zum Markplatz werden neue Schächte und Leitungen für die Fernwärme ausgehoben. Die Pflasterung der Streitgasse wird im zweiten Halbjahr fertiggestellt.

### **Zu erwartende Einschränkungen**

Fussgängerinnen und Fussgänger können die Baustelle immer passieren und die Zugänge zu den Hauseingängen und Geschäften sind stets gewährleistet.

Bis Mitte 2022 ist die Zufahrt in den unteren Teil der Freien Strasse aus Richtung Bankverein und via Bäumeleingasse nicht möglich. Im zweiten Halbjahr ist diese Durchfahrt offen, die Zufahrt via Barfüsserplatz und Streitgasse aber gesperrt. Da die mögliche Anlieferung zu Geschäften und Haushalten je nach Baufortschritt ändert, werden wir die aktuellen Zufahrtsmöglichkeiten im Internet unter [www.tiefbauamt.bs.ch/freie-strasse](http://www.tiefbauamt.bs.ch/freie-strasse) darstellen und den betroffenen Geschäften in Papierform zukommen lassen.

### **Weitere Informationen**

Unter [www.tiefbauamt.bs.ch/freie-strasse](http://www.tiefbauamt.bs.ch/freie-strasse) finden Sie die aktuellen sowie alle früheren Informationen zum ganzen Projekt.

Für weitergehende Auskünfte steht Ihnen der örtliche Bauleiter, Herr Pascal Frei vom Ingenieurbüro Rapp Infra AG, Telefon 058 595 79 14, gerne zur Verfügung. Sollten Sie ausserordentliche Anlieferungen und Transporte (Öllieferungen, Umzug, etc.) planen oder erwarten, bitten wir Sie, ihm diese rechtzeitig zu melden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, insbesondere angesichts den Verschiebungen im Terminprogramm, und wünschen Ihnen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit!

Mit freundlichen Grüssen



Matthias Fluri  
Gesamtprojektleiter
